

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сооружений филиала «Есиль су» на 1.01.2022

по балансовой протяженности водопроводов и отводов

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Всего по филиалу "Есиль су"	Ишимский ПУ	Булаевский ПУ	Соколовский ПУ		Есильский ПУ
				Ишимский в-д	Булаевский в-д	Булаевский в-д	Соколовский в-д	Пресновский в-д
1	2	3	4	5	7	8	9	10
<b>Магистральные водоводы с отводами</b>								
1	Балансовая протяженность водопроводов	км	2924,767	488,893	1598,956	428,691	194,33	213,897
2	Водоводы на техническом обслуживании не принятые на баланс	км	391,697	67,48	191,834	15,872	29,451	87,06
3	Среднесуточная производительность НС 2п.							
	проектная	тыс.м <sup>3</sup> /сут	188,5	50	49	-	11,5	78
	Фактическая.	тыс.м <sup>3</sup> /сут	18,722	4,713	10,62	-	1,143	2,246
4	Населенные пункты СКО							
	пользуются водой	нас.п.	214	33	108	28	18	27
	Населенные пункты Костанайской обл							
	подключены	нас.п						
	пользуются водой	нас.п	19	19				
5	Насосные станции							
	фактически	шт.	22	5	10	1	3	3
6	Мощность СОВ							
	проектная	тыс.м <sup>3</sup> /сут	229,4	60	60		9,4	100
	фактически	тыс.м <sup>3</sup> /сут	22,239	5,712	12,497	-	1,362	2,668
7	Количество РЭУ							
	фактически	шт.	14	3	6	2	1	2
8	Количество РЭК							

9	фактически	шт.	11	2	5	2	-	2
9	Количество РЧВ							
	фактически	шт./тыс.м3	35/53,75	7/11,6	18/23,15	2/3	4/6	4/10
10	Численность населения в поселках СКО, пользующихся водой	чел.	170 325	36 053	69 774	25 835	12 439	26 224
11	Численность населения, пользующихся водой в Костанайской обл.	чел	12 494	12 494	-	-	-	-
12	Общее количество населения, пользующееся водой	чел	182 819	48 547				
13	Количество устраненных подземных повреждений за 2021 год	шт.	1 238	368	579	28	8	255
14	Годы начала и окончания строительства			1961-1968	1962-1971	-	1978-1983	1967-1990

#### Распределительные сети водоснабжения

1	Среднесуточная производительность ПНРС							
	проектная	тыс.м³/сут	3,76				3,76	
	Фактическая.	тыс.м³/сут	0,57				0,57	
2	Населенные пункты СКО							
	пользуются водой	нас.п.	13				13	
3	Насосные станции							
	фактически	шт.	13				13	
4	Мощность системы водоснабжения							
	проектная	тыс.м³/сут	3,76				3,76	
	фактически	тыс.м³/сут	0,57				0,57	
5	Количество ПРВ							
	фактически	шт.	13				13	
6	Количество ВБ							

6	фактически	шт.	13				13	
7	Количество РЧВ							
	фактически	шт./тыс.м3	26/5,1				26/5,1	
8	Численность населения в поселках СКО, пользующихся водой	чел.	9 914				9 914	
9	Годы начала и окончания строительства						2011-2018	


Директор

Согласовано:  
Ковалёв Ю.А.

Чигодаева Е.Д.

Калиев Д.Т.

Махметов А.Е.

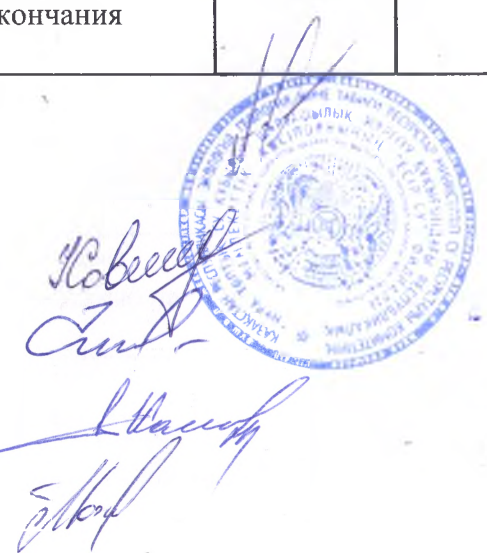

Аскарлов К.К.

Алазова Г.М.

Бакишева А.Т.

Мурдасова Ю.А.

